


“2023, Año de Francisco Villa”
Xalapa, Ver., a 7 de marzo de 2023

Tarjeta informativa.



Asunto: Reporte fotográfico de trabajos CAST.

En el presente reporte se señalan las actividades realizadas en el CAST.

- Cambio de aisladores, cortacircuitos y apartarrayos en cruceta de media tensión que recibe acometida de CFE, sustitución de castillo por tubo PAD para acometida de media tensión.

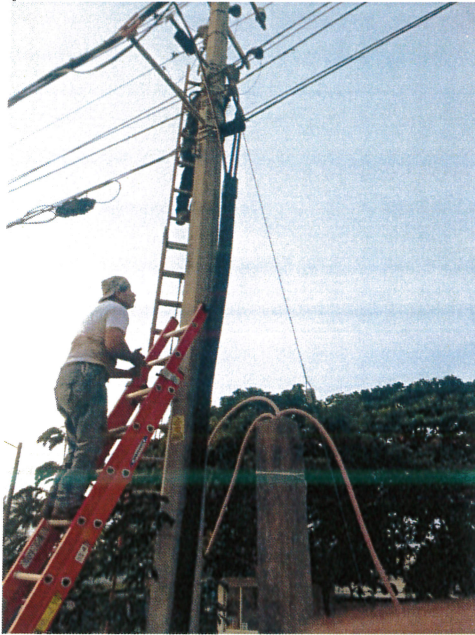


- Sustitución de cable de potencia XLPE del entronque en calle hasta el transformador, con terminales termocontráctiles nuevas.

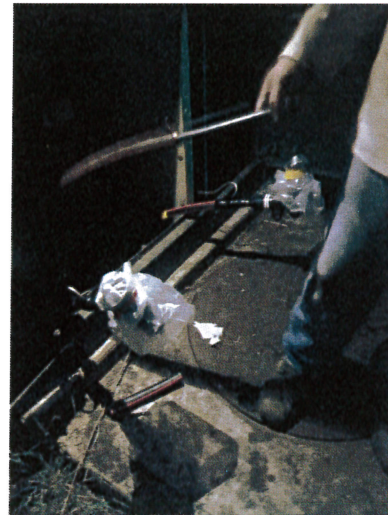



- Cambio de registros en acometida, por registros normalizados.



- Cambio de terminales termocontráctiles en bornes del transformador.



- Se realiza desmonte y limpieza en área circundante a transformador y CCM.



Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
"Transformando Conalep"


Iván Andrade Juárez
Jefe de Infraestructura Educativa
